



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Projekta īstenošanas būtiskākie nosacījumi

1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" ietvaros
Diāna Šklāra
Uzņēmējdarbības un inovāciju departamenta
Uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja
Rīgā 15.12.2017.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Prezentācijas saturs

1. Vērtīgi padomi
2. Projekta īstenošanas pamata posmi
3. Biežāk pieļautās kļūdas



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Sadarbības iestāde

- uzrauga projektu īstenošanu
- sniedz konsultācijas kvalitatīva projekta īstenošanai





Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Aicinām izmantot KPVIS informācijas apmaiņai

Informācija kā kļūt par KPVIS lietotāju ir pieejama:
<http://cfla.gov.lv/lv/par-mums/pakalpojumi/e-vide-14-20>

← → ↻ Secure | <https://ep.esfondi.lv/Login/Index?ReturnUrl=%2fProject> ☆ ⚙ ⚙ ⚙ ⚙ ⋮

 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma

Laipni lūdzam Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam (KP VIS) e-vidē!

Pieslēgties

Lietotājvārds:

Parole:

[Aizmirsu paroli](#)


Notikumi un jaunumi

- Informācija par to kā kļūt par KP VIS e-vides lietotāju pieejama [šeit](#).
- Informējam, ka CFLA [mājaslapā](#) pieejama informācija par izsludinātajām projektu iesniegumu atlasei

KP VIS darbība tiek atbalstīta, izmantojot šādas interneta pārlūkprogrammu versijas:

- o **Internet Explorer v.10.0 vai jaunāka**
- o **Mozilla Firefox**
- o **Google Chrome**

Pārējo pārlūkprogrammu lietošana netiek ierobežota, bet var nenodrošināt pilnu sistēmas funkcionalitāti.



KPVIS atbalsta grupas kontaktinformācija (darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00)



20003306; 66939696



vis@cfla.gov.lv

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Savienības
strukturārfondi un
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

©Centrālā finanšu un līgumu aģentūra <http://cfla.gov.lv>



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Aicinām izmantot «Finansējuma saņēmēja palīgu»

Informācija ir pieejama:

<http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem>

► Izsludinātās atlases

► Projektu īstenošana

► Krāpšanas apkarošana

► **Palīgs finansējuma saņēmējiem**

► Biežāk uzdotie jautājumi

► Infografikas

► Pasākumi

Palīgs finansējuma saņēmējiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izstrādājusi informatīvu materiālu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda potenciālajiem esošajiem finansējuma saņēmējiem, kurā apkopota informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, to iesniegšanas termiņiem un galvenajiem nosacījumiem, un svarīgākajiem procesiem visos projekta ieviešanas posmos.

PROJEKTU ATLASE	ATLĀTA PROJEKTU ATLASE	PROJEKTA IESNIEGUMS	PĀRBAUDE PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETA	LĒMUMS	LĪGUMS
	IEROBEŽOTA PROJEKTU ATLASE				
	UZSĀKOT PROJEKTU	PARAKSTU PARAUĢI	PLĀNOTO MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMU IESNIEGŠANAS GRAFIKS	IEPIRKUMU PLĀNS	AVANSA MAKSĀJUMS
PROJEKTA ĪSTENOŠANA	ĪSTENOŠANAS LAIKĀ	MĀCĪBU NORĪSES GRAFIKS	STARPPOSMA MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS	PVN PĀRSKATS	
	NOŠĻĒDZOT PROJEKTU	NOSĻĒGUMA MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS			
PROJEKTA ILGTSPĒJA	PĒCIZBAUDZĪBAS PERIODS	PĒCPROJEKTA PĀRSKATI	PĀRBAUDE PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETA		

Lai skatītu informāciju par katru sadaļu, spiediet uz attiecīgās sadaļas nosaukuma!



Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Iepirkumu plāna un plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika iesniegšana

Abi dokumenti jāiesniedz **10 darba dienu laikā** pēc līguma ar CFLA noslēgšanas.

Ērtāk ir iesniegt KPVIS.

Maksājumu pieprasījumi	
Iepirkumu plāns	Versija 1
Līgums un grozījumi	Iesniegšanas datums 12.04.2017
Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks	Precizējumu iesniegšanas datums 09.06.2017
Sarakste	

Izmaiņas	Nr.p.k	Iepirkuma līguma priekšmets no iepirkuma plāna	Atsauce uz projekta darbības Nr.	Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	Paredzamā līgumcena	Attiecināmā summa	Tiesiskais regulējums	Plānotā iepirkuma procedūra	Piemērojams zālais iepirkums	Iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš	Piezīmes
Pievienots	3	resursu sistēma	2.	6.4.	268 508.00	268 508.00	PIL 7.pantā pirmā daļa (skatīt Būv 28)	Iepirkums piemērojot līguma ziņģšanas	NĒ	23.08.2016	
Pievienots	2	mazgāšanas iekārta	1.	6.2.	124 000.00	124 000.00	PIL 7.pantā pirmā daļa (skatīt Būv 28)				
Pievienots	1	ražošanas līnija	3.	6.	1 138 410.00	1 138 410.00	PIL 7.pantā pirmā daļa (skatīt Būv 28)				

Maksājumu pieprasījumi			Plānoto maksājumu		
Iepirkumu plāns			Prognozes numurs 2		
Līgums un grozījumi			Iesniegšanas datums 27.11.2017		
Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks			PMPIG statuss Apstiprināts		
Iesniegšanas termiņš	MP veids	MP Nr.	Izmaksu sadalījums pa finansējuma avotiem, EUR		
			Kopā	ES fonda finansējums	Privātais finansējums
01.11.2017	Starposma	1	0.00	0.00	0.00
30.03.2018	Starposma	2	0.00	0.00	0.00
30.09.2018	Starposma	3	2 450 000.00	857 500.00	1 592 500.00
30.03.2019	Starposma	4	0.00	0.00	0.00
30.09.2019	Starposma	5	0.00	0.00	0.00
05.01.2020	Noslēguma	6	4 550 000.00	1 592 500.00	2 957 500.00
Prognozes kopā			7 000 000.00	2 450 000.00	4 550 000.00
Avansi kopā			0.00	0.00	0.00
Līguma attiecināmās izmaksas			7 000 000.00	2 450 000.00	4 550 000.00
Neizlietotais finansējums			0.00	0.00	0.00




Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Iepirkumi, to pārbaudes

Atbalsta saņēmējiem ir saistoši MK noteikumi Nr.104*

pozitīvs, negatīvs atzinums,
atzinums ar iebildumiem

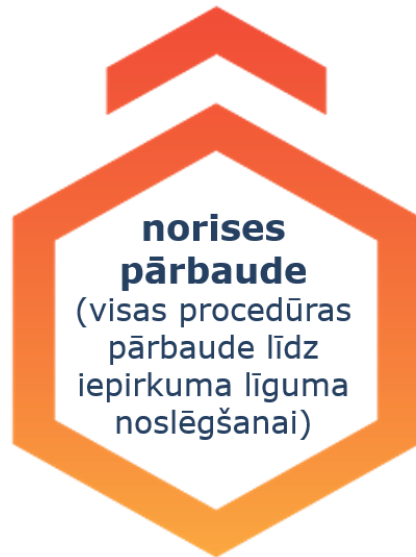

līdz iepirkuma līguma noslēgšanai
(ir iespējams sniegt atzinumu)

atzinumu sniegt nav iespējams



**pie maksājuma pieprasījuma
izvērtēšanas**

(ja iepirkuma līgums noslēgts,
pirmspārbaude nav iespējama,
atzinumu sniegt nav iespējams)

* 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.104 «Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem»





Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Palīgmateriāls

Ja ir šaubas, vai rīcība ir pareiza, to var pārbaudīt, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātās metodikas MK noteikumu Nr.104 procedūru pārbaudei.

Pieejamas - <http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi>

Iepirkumu veikšana				
7.3.	Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā" (iepirkumiem, kas izsludināti no 2017.gada 1.marta)	6.	 vadlīnijas  pielikumi	07.04.2017.



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Maksājuma pieprasījuma veidi

Avansa maksājums

(nevar pārsniegt 35% no ERAF finansējuma, var izņemt daļās, jāizlieto 18 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu)

Starpposma maksājuma pieprasījums

(jāiesniedz ne retāk kā reizi par katrām trīs projekta īstenošanas mēnešiem 2 nedēļu laikā pēc attiecīgā perioda beigām)

Noslēguma maksājuma pieprasījums

(ERAF daļa nevar būt mazāka par 10% no ERAF finansējuma)

Iekļauj faktiski veiktos izdevumus un dzēs avansu, ja tāds tika izmaksāts



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Biežāk pieļautās kļūdas, īstenojot projektu

- Netiek iesniegts un aktualizēts plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks un iepirkumu plāns.
- Iepirkumu plānā kā «zaļais iepirkums» norādītas iekārtas, kas nekvalificējās «zaļā iepirkuma» prasībām.
- Avansa maksājumam netiek pievienoti pamatojošie dokumenti.*
- Progresā pārskatos netiek atspoguļots aktuālais projekta īstenošanas progress.

Darbības Nr.	Visas projekta iesniegumā plānotās projekta darbības	Visi projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (vienādi ar projekta iesnieguma 1.5. sadaļā norādīto)			Darbības īstenošanā veiktie pasākumi pārskata periodā	Norises vieta	Faktiski uzsāktās / veiktās darbības un sasniegtie rezultāti					Piezīmes	
		rezultāti	skaits	mērvienība			2017	I	II	III	IV		Kopā
1.	Līgumu slēgšana ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju	Līgumi ar iepirkuma procedūras uzvarētājiem	1	Līgums	1	Rīgā	X						1.00
2.	Iekārtu izgatavošana, piegāde, uzstādīšana		6	Iekārtas									6.00
3.	Eksperimentālās tehnoloģijas testēšana reālā ražošanas vidē, veicot saimniecisko darbību, līdz TRL Nr. 8, jaunā produkta testa partiju ražošanai	Eksperimentālā tehnoloģija 12 laikā uzrādījusi stabilu darbību nepārtrauktas, intensīvas ekspluatācijas apstākļos.	12	mēneši									0.00
4.	Noslēguma pārskata iesniegšana CFLA	Sagatavots un iesniegts noslēguma pārskats izvērtēšanai	1	Pārskats									0.00

* Pamatojošo dokumentu saraksts pieejams (http://cfla.gov.lv/userfiles/files/1214_attiecinamo_izmaksu_dok_saraksts.pdf)



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Biežāk pieļautās kļūdas, īstenojot projektu (II)

- Maksājuma pieprasījumos ir nekorekti aizpildītas sadaļas, netiek pievienoti izdevumus pamatojošie dokumenti.

(CFLA mājaslapā sadaļā <http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/starpposma-maksajuma-pieprasijums> pieejami aizpildīšanas ieteikumi)

! Informācija par HP „Ilgstspējīga attīstība” ieviešanu norādāma kumulatīvi.

Maksājuma pieprasījuma aizpildīšanas ieteikumi



Maksājuma pieprasījuma E sadaļas aizpildīšanas ieteikumi



- Attiecināmajās izmaksās tiek iekļautas apmācību, piegādes izmaksas, kas nav attiecināmas MK noteikumu Nr.293* 38.punkta izpratnē.
- Visos ar projekta īstenošanu saistītajos dokumentos nav norādīts projekta identifikācijas numurs.

(piemēram, «LĪGUMS AR CFLA Nr.1.2.1.4/16/A/000»)

*Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumi Nr. 293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi"



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Biežāk pieļautās kļūdas, īstenojot projektu (III)

- Veicot publikācijas mājaslapā par projekta īstenošanas progresu, netiek ievērotas vizuālās identitātes prasības.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Vadlīnijas pieejamas <http://esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi>, maketu izstrādes rīks pieejams <http://esfondi.lv/maketu-riks>.

- Netiek iesniegtas garantijas, kas ir nepieciešamas maksājuma veikšanai atbalsta saņēmējam atbilstoši MK noteikumu Nr.293 prasībām*.
- Tiek iesniegtas garantijas, kas ir nepieciešamas maksājuma veikšanai atbalsta saņēmējam, taču ar neatbilstošu derīguma termiņu.

*Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumi Nr. 293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi"



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Biežāk pieļautās kļūdas, īstenojot projektu (IV)

- Tiek ierosināti grozījumi, kas nav atbalstāmi.

(!) ar grozījumiem nevar:

- * palielināt ERAF finansējuma apjomu vai
- * samazināt sasniedzamos rādītājus

Jāizvērtē, vai grozījumi neietekmē aģentūras apstiprināto projekta iesnieguma vērtējumu un vai izpildās MK noteikumu Nr.293 VI. sadaļā minētie projekta īstenošanas nosacījumi.

3) projekta iesniegums atbilst kvalitātes kritērijiem un tam ir piešķirti **39 punkti**:

Kritērija/apakskritērija Nr.	Punktu skaits
1.	8
2.	3
3.1.	5
3.2.	3
3.3.	1
3.4.	0
4.	1
5.	5
6.	0
7.	4
8.	5
9.1.	2
9.2.	2
9.3.	0

VI. Projekta īstenošanas nosacījumi

44. Projekta īstenošanas vieta šo noteikumu izpratnē ir vieta, kur projekta iesniedzējs ražo savu produkciju vai sniedz pakalpojumus. Projektu var īstenot vairākās adresēs, ja šajās adresēs ir izvietota vienota ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ķēde. Projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.

45. Lai noslēgtu līgumu ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē vienu vai vairākus šādus finansējuma pieejamību apliecināto dokumentus:

45.1. līgums, kas noslēgts ar Eiropas Savienībā reģistrētu kredītiestādi, par projekta īstenošanai nepieciešamā aizdevuma piešķiršanu vismaz 50 % apmērā no projekta kopējām izmaksām;

45.2. līgums, kas noslēgts ar saistīto personu par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu, ja saistītās personas pēdējā noslēgtajā gada pārskatā norādītais pašu kapitāls veido vismaz 100 % no projekta kopējām izmaksām;

45.3. projekta iesniedzēja valdes lēmums par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem, ja projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtajā gada pārskatā norādītais pašu kapitāls veido vismaz 100 % no projekta kopējām izmaksām.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 423)

- Pagarinot projekta īstenošanas termiņu, netiek pagarināts iesniegto garantiju derīguma termiņš.



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Lai izdodas veiksmīga un kvalitatīva inovatīvu projektu iesniegumu sagatavošana un projektu īstenošana!





Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Paldies par uzmanību!

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē
